


## 6 Kapasitetsbehov, elevtallsutvikling og alternative løsninger i skoleområdene



Kalkylen for å realisere den vedtatte skolebehovsplanen har blitt høyere enn forutsatt da planen ble vedtatt. Dette skyldes blant annet prisveksten i markedet og at omkringliggende forhold har slått uheldig ut i prosjektene (eksempelvis grunnforhold). Utgangspunktet for revisjon av skolebehovsplanen er å holde kommunens investeringsbehov i den kommende perioden på et akseptabelt nivå, samtidig som kommunen til enhver tid har nødvendig elevkapasitet på riktig sted. I tillegg til investeringsbehov og elevkapasitet skal elevers læringsmiljø og ansattes arbeidsmiljø vektlegges.

I dette kapittelet omtales skoleområdene i tråd med inndelingen fra skolebehovsplanen vedtatt av kommunestyret april 2020. For samtlige skoleområder er løsningsalternativ 0 tilsvarende vedtaket som ble fattet 22.04.2020. I de skoleområdene vedtaket fra 2020 legges til grunn er det ikke angitt andre alternativer. Det betyr at kommunedirektøren ikke foreslår noen endringer i disse områdene. I de skoleområdene hvor det er nødvendig å se på alternative løsninger, er fortsatt alternativ 0 vedtaket fra 2020 med, mens øvrige alternativer er nyere vurderinger. Alternativ 1 er den løsningen som anbefales realisert. Kostnaden for alternativ 0 er oppdatert med tall som kan sammenlignes med de øvrige alternativene. Årstallene er likeledes oppdatert, slik at de er relevante for dagens plan.

I arbeidet med revidering av skolebehovsplanen skiller tre skoleområder seg ut ved at de ikke har behov for fornyet vurdering i denne planperioden. Dette gjelder områdene 6.3 Sørum, 6.8 Fetsund øst og 6.9 Dalen.

Tabellene nedenfor viser elevtallsutviklingen i planperioden for de ni skoleområdene ut fra eksisterende skolekretsgrenser, jf. gjeldende forskrift om skolekretser i Lillestrøm kommune.

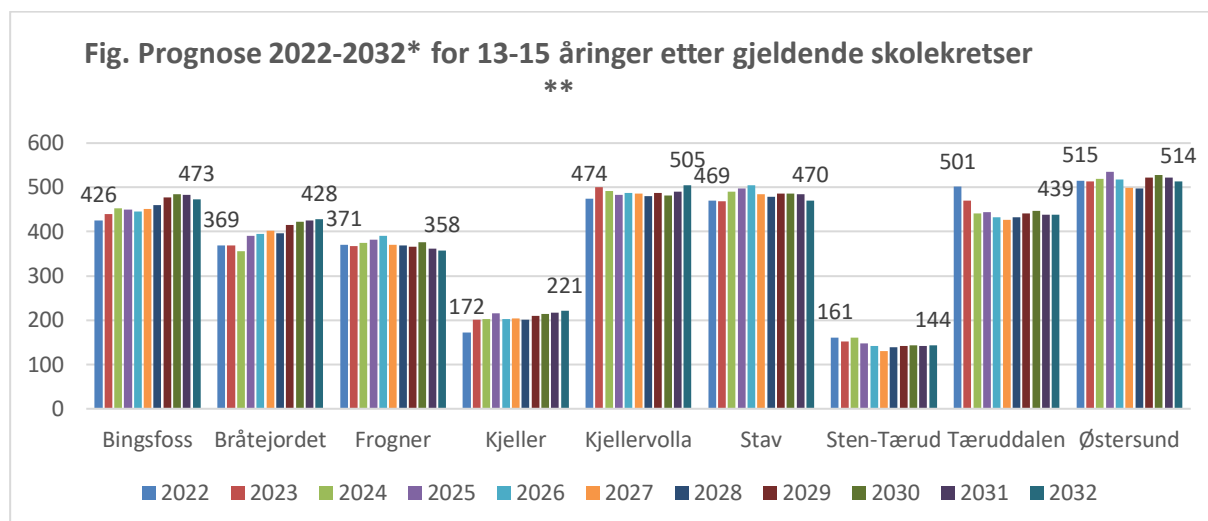

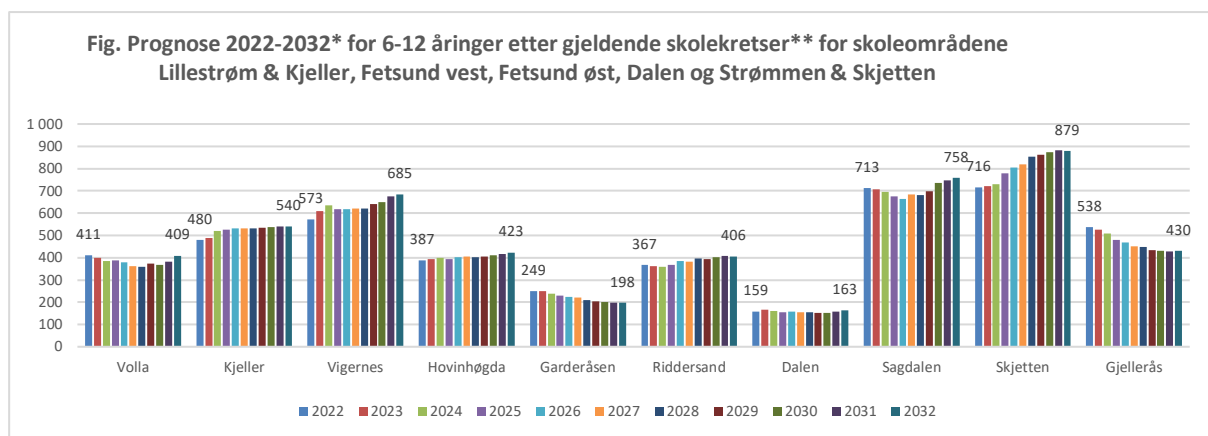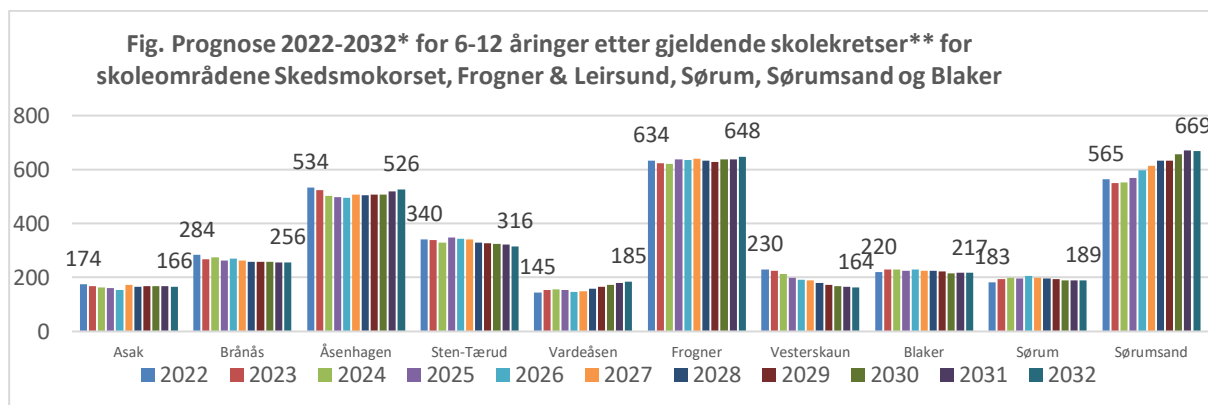

Kilde Kompas \* Befolkning etter bosted per 01.01\*\*Forskrift vedtatt av kommunestyret 17.12.19

Disse tabellene må sees i sammenheng med tabellene under pkt. 9.4 hvor alle foreslåtte endringer i perioden 2022 til 2031 er innarbeidet.

## 6.1 Lillestrøm og Kjeller

Skoleområdet Lillestrøm og Kjeller er i stor grad sammenfallende med byvekstområdet Lillestrøm by og Kjeller. Her viser oppdatert prognose elevtallsvekst fram mot 2032 i Kjeller skolekrets og i skolekretsene Vigernes, Kjellervolla/Sophie Radich(ungdomsskole). Veksten blir noe sterkere enn tidligere anslått i prognosen som ble brukt i forbindelse med skolebehovsplan 2020-2029 ("tidligere prognose") i Kjeller skolekrets, og noe svakere i Vigernes, og Kjellervolla (Sophie Radich). I Volla skolekrets vil elevtallet falle svakt til 2027, for deretter å øke noe mot slutten av planperioden. Tidligere prognose viste et fallende elevtall tidlig i planperioden, og sterk vekst i slutten av planperioden. Avviket skyldes blant annet at et stort antall planlagte nye boliger i Lillestrøm Nord, som lå i boligprogrammet 2020-2029, er skjøvet ut i tid (fra 2030 til 2042).

Skoledrift på Sophie Radich er et halvt år forsinket og tilbakeflytting til rehabilitert Volla blir forsinket med ett år.

### 6.1.1 Alternativ 0

Sophie Radich tas i bruk som ny ungdomsskole ved nyttår 2022/2023.

Kjellervolla tas i bruk som barneskole fra skoleåret 2023/2024.

Volla skole rehabiliteres skoleårene 2023/2024 og 2024/2025, og virksomheten overføres midlertidig til Kjellervolla skole. Fremdriften på Volla påvirkes av fremdriften på Sophie Radich. Prosjektet er igangsatt og forventes slutført til skoleåret 2025/2026.

I 2025/2026 etableres Kjellervolla barneskolekrets. Kretsen vil omfatte deler av dagens Volla, Vigernes, Kjeller og Sten-Tærud skolekrets. Det gjennomføres en arealrevisjon for å tilrettelegge Kjellervolla som barneskole.

Kjeller skole bygges ut med behovsdekkende kapasitet med ferdigstilling til skoleåret 2026/2027.

### 6.1.2 Alternativ 1

Sophie Radich tas i bruk som ny ungdomsskole ved nyttår 2022/2023.

Kjellervolla tas i bruk som barneskole fra skoleåret 2023/2024. I tillegg til en bruksendring fra dagens ungdomsskole til barneskole, anbefales det en fremtidig utvidelse av skolen fra en 2-parallell til 4-parallell barneskole med ferdigstilling til skoleåret 2029/2030.

Rehabilitering av Volla skole forutsettes utført iht. alternativ 0. Volla utvides deretter med nybygg til en 3-parallell barneskole med ferdigstilling til skoleåret 2029/2030, for å sikre tilstrekkelig kapasitet videre og utover planperioden.

På Sophie Radich blir det noe overkapasitet de første driftsårene, men det vil ikke være tilstrekkelig kapasitet til å romme f.eks. alle ungdomstrinnselevne på Kjeller. Elevene på ungdomstrinnet på Kjeller ses derfor i sammenheng med skoleområde 6.2 Skedsmokorset, Frogner og Leirsund. Hensikten er å samle ungdomsskoleelevne fra Sten-Tærud og Kjeller i en felles 4-parallell skole, slik at Kjeller og Sten-Tærud kan transformeres til barneskoler. Løsningsalternativene for Sten-Tærud beskrives nærmere under avsnittet for Skedsmokorset, Frogner og Leirsund.

På Kjeller skole er det ikke forutsatt bygningsmessige tiltak i forbindelse med at ungdomsskole flyttes ut, men paviljongene avvikles.

## 6.2 Skedsmokorset, Frogner og Leirsund

Skoleområdet omfatter skolene Tærudalen, Brånås, Sten-Tærud, Vardeåsen, Åsenhagen, Frogner, Vesterskaun og Asak. Elever på ungdomstrinnet ved Kjeller ses i sammenheng med løsning for elevene ved Sten-Tærud. Elevmassen på ungdomstrinnet ved Kjeller vurderes derfor inn i kap. 6.2 Skedsmokorset, Frogner og Leirsund.

### 6.2.1 Skedsmokorset

Oppdaterte elevtallsprognoser er innhentet og tallmaterialet er bearbeidet. For Sten-Tærud skolekrets anslås antall 6-15 åringer i ny prognose å falle svakt i perioden 2022-2031. Skolebehovsplanens prognose fra 2020 viste en vekst. Noe av forklaringen på avviket er

teknisk, blant annet at elevveksten som følge av nytt boligfelt i Brauterbakken tilfaller Kjeller (og Kjellervolla ved foreslåtte nye skolekretser) og ikke Sten-Tærud.

I ny prognose er nedgangen i antall elever i Brånås skolekrets litt mindre i slutten av planperioden og antall elever i Vardeåsen skolekrets litt høyere, sammenlignet med prognosen fra 2020. Elevtallet i Åsenhagen skolekrets vil holde seg stabilt i planperioden. Alt i alt for disse tre skolene viser nye prognosetall kun mindre avvik med prognosen fra 2020.

Tomtesituasjonen ved Sten-Tærud må følges opp særskilt. Det er varslet betydelig regulering av festeavgiften. Kommunen vil årlig måtte betale en festeavgift på kr. 1,3-3 mill. kroner. Endelig beløp er foreløpig ikke fastsatt.

#### 6.2.1.1 Alternativ 0

Åsenhagen skole rehabiliteres med ferdigstillelse til skoleåret 2025/2026.

Sten-Tærud skole rehabiliteres med ferdigstillelse som barneskole til skoleåret 2027/2028.

Tæruddalen bygges ut til sju paralleller med ferdigstillelse til skoleåret 2024/2025<sup>1</sup>.

Elever bosatt på Hekseberg, dvs. deler av grunnkrets 1605 Hekseberg, overføres fra Frogner skolekrets til Vardeåsen skolekrets fra skoleåret 2024/2025. Ved overgang til ungdomstrinnet får elever fra hele Vardeåsen skolekrets Tæruddalen som hjemmeskole.

Prestegårdshagen, grunnkrets 701 og 702, overføres fra Vardeåsen skolekrets til Sten-Tærud skolekrets fra skoleåret 2027/2028. Vardeåsen skole bygges ut som en 1-7-skole med to paralleller med ferdigstillelse til skoleåret 2024/2025.

Brånås videreføres som i dag.

#### 6.2.1.2 Alternativ 1

Etter skolebehovsplanvedtaket er det uttrykt et sterkt innbyggerønske om å beholde elevene på Hekseberg i Frogner skolekrets. Veksten på Frogner blir noe svakere enn tidligere prognostisert. Det er derfor hensiktsmessig å beholde elevene fra Hekseberg på Frogner, for å utnytte eksisterende kapasitet.

Løsningen bidrar også til å redusere trykket på Vardeåsen og Tæruddalen. I anbefalt løsningsalternativ beholdes Tæruddalen som en 5-parallell ungdomsskole, og paviljongene avvikles når elevtallet er nede på 5-parallell-nivå. Hovedårsaken er de utfordrende og kostnadsdrivende grunnforholdene ved Tæruddalen ungdomsskole.

Utbygging av Vardeåsen skole avventes. En omgjøring av grensejusteringen mellom Hekseberg og Vardeåsen skole, samt opprettholdelse av dagens skolegrenser for Vardeåsen og tilføring av Tuterudfeltet fra Brånås til Sten-Tærud, vil sikre en robust

---

<sup>1</sup> En 7-parallell i Tæruddalen gir ikke tilstrekkelig kapasitet, siden skolen også må ha arealer til innføringsklasser. I praksis er behovet utbygging til en 8 parallell ungdomsskole.

barneskole ved Sten-Tærud, med god fyllingsgrad. Samtidig blir en utbygging av Vardeåsen overflødig i planperioden. Dette ansees å være gunstig for barnehagedriften ved skolen.

Elevene ved Sten-Tærud og Kjeller anbefales samlet i en 4-parallell ungdomsskole. Det anbefales å leie lokaler til en 4-parallell ungdomsskole for å redusere investeringsbehovet. Sønderinger for leie av lokaler i Kjellerområdet er påbegynt og det finnes mulige lokaler. Hvis ungdomstrinnene flyttes ut av både Kjeller og Sten-Tærud, er planen at barneskoletrinnene blir igjen på dagens lokasjoner.

På Sten-Tærud er det behov for en 2-parallell barneskole. Bygningsmassen på Sten-Tærud nærmer seg 70 år, og det foreslås totalrehabilitering av eksisterende bygg, mens småskolen anbefales revet. Dagens lokalisering er god mht. skolens elevgrunnlag, men forhold knyttet til støy og støv må utredes. Sten-Tærud barneskole anbefales derfor rehabilitert med ferdigstilling til skoleåret 2027/ 2028. Det forutsetter at ungdomskolen flytter ut i 2025. Flytter ungdomsskolen senere må prosjektet skyves tilsvarende ut i tid.

Åsenhagen skole rehabiliteres. Det anbefales at rehabilitering av Åsenhagen prioriteres, og at det tas sikte på ferdigstilling til skoleåret 2025/2026.

Brånås videreføres som i dag.

#### 6.2.1.3 Alternativ 2

2-parallell barneskole og 4-parallell ungdomsskole etableres ved modernisering og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, rehabilitering av idrettsbygg og nybygg der småskolen er lokalisert. Den samlede bygningsmassen vil dekke behovet for 2-parallell barneskole og 4-parallell ungdomsskole.

Elever fra Prestegårdshagen inkluderes. Ferdigstilling 2027/2028.

#### 6.2.1.4 Alternativ 3

Løsningsalternativet innebærer ny 4-parallell ungdomsskole og ny 2-parallell barneskole innenfor dagens tomtegrenser. For å løse det fremtidige behovet rives dagens bygningsmasse med unntak av idrettsbygget, som forutsettes rehabilitert. Det bygges nye skolelokaler til undervisning, både for ungdomsskolen og barneskolen. Eksisterende bygningsmasse videreføres ikke til undervisningsformål.

Elever fra Prestegårdshagen inkluderes. Ferdigstilling 2027/2028.

### 6.2.2 Frogner

Store deler av Frogner skolekrets defineres som prioritert vekstområde. Fra 2022-2031 får skolekretsen en flat eller svak oppgang i antall 6-12 åringer. I tidligere prognose viste denne en sterk vekst. Fra 2032 til 2042 viser ny prognose sterk vekst av antall 6-12 åringer i skolekretsen, nær 200 barn.

Prognosen for elevtallet ved Vesterskaun er svakt fallende i perioden 2022-2031. Antall elever i slutten av planperioden vil kun avvike marginalt sammenlignet med prognosen som ble kjørt i 2020. Det folkeregistrerte elevtallet for 6-12 åringer per 01.01.2022 er likevel ca. 20

elever over det estimerte elevtallet per 01.01.2022. Nettotilflyttingen til skolekretsen har med andre ord de siste to årene vært større enn forventet. Fra 2032 til 2042 vil elevtallet holde seg stabilt.

Ny prognose viser at antall 13-15 åringer i Frogner ungdomsskolekrets vil øke med ca. 20 elever fram mot 01.01.2026, for deretter å synke mot dagens elevtall i slutten av planperioden. Fra 2035 viser ny prognose en sterk vekst fram mot 2042 (75 elever).

Det foreligger både drifts- og pedagogiske utfordringer ved Frogner skole. Løsninger på disse utfordringene bør søkes løst i samarbeid mellom skolen og skolens rådsorganer. Det bør derfor avsettes midler til skolen for å gjøre bygningsmessige tilpasninger, slik at skolen kan deles inn i en ungdomsskole og en barneskole med separate ledelser. Dette kan enten skje gjennom en utvidelse av dagens bygningsmasse, eller gjennom å bygge en ny ungdomsskole på Frogner.

Det er besluttet at Frogner skole skal få paviljonger til skolestart august 2022, noe som sikrer tilstrekkelig kapasitet i planperioden.

På Vesterskaun har det gjennom mange år blitt lovet ny skole. Det er store forventninger til ny skole i foreldregruppa, og erfaringen er at en grendeskole bidrar positivt i et lokalmiljø. Imidlertid kan en liten skole ha utfordringer mht. rekruttering av lærere med riktig kompetanse innenfor enkelte fagområder. Slik kompetanse er nødvendig for å ha et høyt læringstrykk over tid. Dette kan avbøtes med en tilførsel av noe ekstra lærerressurser. Ekstra lærerressurser vil øke skolens driftsutgifter, noe som er uheldig sett i lys av den økonomiske situasjonen i Lillestrøm kommune.

Bebyggelsen på Lundermoen/ Lunderåsen danner grunnlaget for den største andelen av elevene på Vesterskaun. Bebyggelsen i dette området er relativt ensartet, noe som medfører at elevtallet stagnerer og går nedover på sikt. Det foreligger ingen planer om videre utbygging av området rundt Lunderåsen eller Størsrudåsen i planperioden. Det er utfordrende med forholdsvis lave elevtall pr. trinn, både av hensyn til skoledriften, men også av hensyn til behov for klassedeling ved små svingninger i elevtallet. Usikkerhet i framtidig elevtall og skolens plassering Lunderåsens randområde, samtidig som en sentralt tomt er avsatt i Lunderåsen/Størsrudåsen, medfører at investeringene i skolebygget utsettes og ny vurdering av prosjektet gjøres i slutten av planperioden.

Vesterskaun skole fikk bevilget 22 millioner til utbedringer etter kommunestyrevedtak i Sørums kommunen den 22.06.2016. For det tildelte beløpet ble bla. kuldebroer utbedret, ventilasjonsanlegg og noen elektriske installasjoner oppgradert. Svømmebassenget ble stengt og noe av garderobefasilitetene ble omgjort til andre formål. Paviljongene ved skolen er imidlertid gamle og til dels i dårlig forfatning. Skolen viser et synkende elevtall gjennom hele perioden basert på befolkningsprognosene. Reelt elevtall ser ut til å ligge noe høyere enn det befolkningsprognosene viser. Dette betyr at det er vanskelig å treffe riktig på dimensjoneringen av skolen.

#### 6.2.2.1 Alternativ 0

Frogner skole opprettholdes som 1-10-skole med fire paralleller<sup>2</sup>.

Vesterskaun skole erstattes med nybygg til 1-7 skole med 11 klasserom (1,5 parallell), og ferdigstillelse til skoleåret 2025/2026.

#### 6.2.2.2 Alternativ 1

Dagens skolekretser for Frogner og Vesterskaun opprettholdes.

Hekseberg grunnkrets deles ikke. Det er tilstrekkelig kapasitet for Hekseberg-elevene innenfor dagens 4-parallell i hele planperioden. På Frogner etableres det paviljong for deler av ungdomstrinnet fra høsten 2022, og på Vesterskaun erstattes paviljongene med ny paviljong til skoleåret 2023/2024.

#### 6.2.2.3 Alternativ 2

På Frogner kom det et innbyggeroppdrag sommer/høst 2021 med ønske om ny ungdomsskole på Frogner. En ny ungdomsskole på Frogner vil bidra til at konseptet med rene barneskoler og ungdomsskoler styrkes. Samtidig vil det bidra til at barneskolen får friggitt fasiliteter som kan lette på driften. Det er store avstander i dagens anlegg, noe som medfører driftsutfordringer. Det vil lette driften av skolen å ha noe mer areal tilgjengelig desentralisert i bygningsmassen. I tillegg vil en ny ungdomsskole bidra til at kapasiteten på barneskoletrinnene kan inkludere både Hekseberg og Vesterskaun i overskuelig fremtid. En ny ungdomsskole bør etableres i nærheten av fasilitetene i kultursenteret på Frogner skole, og i gangavstand til idrettshall og svømmehall med ferdigstillelse til skoleåret 2034/2035.

#### 6.2.2.4 Alternativ 3

Det etableres en skole (1,5 parallell) med forventet elevgrunnlag på Vesterskaun, selv om skolen blir mindre enn anbefalt 2-parallell barneskole. Ferdigstillelse til skoleåret 2025/2026.

På Frogner er det behov for å gjøre tiltak som bedrer situasjonen for dagens skoledrift. Det legges opp til en utvidelse av arealene ungdomsskolen er lokalisert i, slik at barne- og ungdomsskolen kan separeres med hver sin administrasjon. En utvidelse av bygningsmassen fra 2006 (B-bygget) vil gi ungdomstrinnet bedre handlingsrom, men det blir fortsatt utfordrende å drifte barneskolen, uten desentraliserte fasiliteter for tilrettelagt undervisning og administrasjon. En utvidelse på ungdomstrinnet må ivareta 5-parallell ungdomsskole og arealer til administrasjon og tilrettelagt undervisning. Ferdigstillelse til skoleåret 2025/2026.

### 6.2.3 Leirsund

De siste to årene har vi sett en nettoinnflytting til Leirsund. Prognosen som ble brukt i vedtatt skolebehovsplan viste at Asak skolekrets ville få en svak nedadgående elevvekst i hele perioden. Oppdatert prognose i 2022 viser at antall 6-12 åringer og 13-15 åringer vil holde seg stabilt fra 2022 til 2031, og hhv. ca. 20 og 10 elever på barne- og ungdomstrinnet over

---

<sup>2</sup> Hekseberg grunnkrets deles.

skolebehovsplanens prognose fra 2020. For de fleste trinn vil elevtallet ligge tilstrekkelig under 28 og 30 på barne- og ungdomstrinnet, men på enkelte trinn i enkelte år i planperioden kan elevtallet unntaksvis medføre klassesprekk. Asak har tilgang til arealer for midlertidige løsninger i form av paviljonger, bruk av gamleskolen eller mulig omdisponering av indre rom. Det fremlegges derfor ikke forslag til alternative løsninger på Asak.

#### 6.2.3.1 Alternativ 0

Asak skole opprettholdes som 1-10-skole med én klasserekke.

### 6.3 Sørumsand

Sørumsand skole opprettholdes med samme skolekrets som i dag. Skolen vil ha vekst i elevtallet fram mot 2026 (ca. 25 elever), for deretter å synke til litt over dagens elevtall i slutten av planperioden. Skolen ansees å ha tilstrekkelig romkapasitet i hele planperioden.

#### 6.3.1 Alternativ 0

Sørumsand skole opprettholdes med samme skolekrets som i dag.

### 6.4 Sørumsand

Skoleområdet omfatter skolene Bingsfoss og Sørumsand.

Ny prognose for antall 6-12 åringer og 13-15 åringer for planperioden 2022 til 2031 er omtrent som forventet, følger samme utvikling og er ganske lik prognosen som ble brukt i forbindelse med skolebehovsplanen i 2020. I ny oppdatert prognose anslås veksten i Bingsfoss skolekrets (aldersgruppe 13-15 år) å bli på ca. 60 elever i perioden 2022 til 2031.

I Sørumsand barneskolekrets viser ny prognose en vekst i antall 6-12 åringer på ca. 100 elever i planperioden 2022-2031.

Antall 6-12 åringer og antall 13-15 åringer i barne- og ungdomsskolekretsen forventes å holde seg relativt stabilt etter planperioden (fra 2032 til 2042).

#### 6.4.1 Alternativ 0

Bingsfoss ungdomsskole opprettholdes som i dag, men bygges ut til en 6-parallell ungdomsskole med ferdigstillelse til skoleåret 2025/2026.

Sørumsand skole bygges ut som en 4-parallellers barneskole med ferdigstillelse til skoleåret 2026/2027.

Det gjøres en senere vurdering av om deler av grunnkrets 0201, Haga, bør overføres fra Riddersand til Sørumsand skolekrets.

Det bygges en ny svømmehall med ferdigstillelse i 2025.



### 6.4.2 Alternativ 1

Bingsfoss ungdomsskole bygges ut tilsvarende alternativ 0. En fullverdig 6-parallell ungdomsskole krever ombygging i deler av eksisterende skole og to tilbygg. Med bakgrunn i krav i områdeplanen for Sørumsand må det gjennomføres en reguleringsprosess. Ferdigstillelse til skoleåret 2025/2026.

Sørumsand skole har tilstrekkelig kapasitet med paviljonger til å møte elevtallsutviklingen i planperioden. Det anbefales derfor at paviljongene videreføres, og at kapasitetsbehov og utvidelse av skolen gjøres permanent mot slutten av planperioden.

Deler av grunnkrets 0201<sup>3</sup>, Haga, overføres fra Riddersand til Sørumsand skolekrets til skoleåret 2023/2024.

Etablering av ny svømmehall på Sørumsand følges opp av Idrett/ Kultur. Prosjektet avsetter kr 120 mill. kroner til formålet.

## 6.5 Blaker

Skoleområdet omfatter Blaker skole etter at Haugtun skole ble nedlagt i 2021.

Elevtallet forventes å holde seg relativt stabilt fra 2022 til 2031, også etter denne planperioden (2032 -2042).

### 6.5.1 Alternativ 0

Haugtun skole er nedlagt.

Blaker (tidligere Fjuk) skole ble opprettet som en felles barneskole fra høsten 2021. Det gjennomføres en arealrevisjon og oppgradering av skolebygget for å tilrettelegge skolen for et høyere elevtall.

### 6.5.2 Alternativ 1

Løsningsalternativ 0 anses ikke som komplett, siden arealrevisjonen synliggjorde at Blaker må utvides for å ha kapasitet til elevene. Det er etablert paviljong på Blaker skole i forbindelse med overføring av elevene fra Haugtun. Det anbefales derfor at skolen driftes med paviljong de kommende årene. En noe mer langsiktig plan blir en oppgradering og utvidelse av skolebygget med et tilbygg med ferdigstillelse til skoleåret 2028/2029. Oppstart av byggeaktiviteter på Blaker forutsetter at Skåningsrud er flyttet til Haugtun.

## 6.6 Strømmen og Skjetten

Skoleområdet omfatter skolene Bråtejordet, Stav, Gjellerås, Sagdalen og Skjetten. Skjærva ble ikke realisert etter vedtak 15.12.2021.

---

<sup>3</sup> Grunnkretsen deles i sør ved Løvås, Rovenveien, jf. kart

Den største veksten fram mot 2030 kommer i den foreslåtte Skjærva skolekrets, hvor elevene i dag har barneskoletilhørighet til Skjetten og Sagdalen. Alternative løsninger for å møte elevveksten omtales i dette kapitlet.

Oppdatert prognose viser noe sterkere vekst for Stav i planperioden, enn tidligere prognostisert.

#### 6.6.1 Alternativ 0

Det bygges en ny barneskole med to paralleller på avsatt tomt i Skjærva-området, med ferdigstillelse til skoleåret 2024/2025.

Bråtejordet, Stav, Gjellerås, Sagdalen og Skjetten opprettholdes som i dag med de endringer jf. pkt. 6.6, som følger av etablering av en ny barneskole innenfor skoleområdet, og vedtak gjort i forbindelse med behandling av Skedsmo kommunes skolebehovsplan i 2018.

#### 6.6.2 Alternativ 1

I henhold til kommunestyrets vedtak 15.12.2021 i sak 21/193 skal ikke Skjærva skole realiseres. For å avbøte veksten i skoleområdet forslås det en kretserevisjon. Dette vil innebære at man flytter grunnkretser fra Skjetten skole til Gjellerås skole, samtidig som man flytter noen av "Skjærva- kretsene" fra Skjetten og Sagdalen skole til Volla skole.

I alternativ 1 for Volla skole legges det til grunn en utvidelse til 3-parallell skole. Dette vil bidra til at Volla kan ha kapasitet til å motta kretsene fra Sagdalen/Skjetten på middels og lang sikt.

I tillegg foreslås det en kretsjustering mellom Volla skole og Kjellervolla skole. En moderat kretsendring mellom Sagdalen og Skjetten vil sikre at Sagdalen får alle sine elever over til Bråtejordet ungdomsskole. Kretsjusteringene utføres når Volla står klar skoleåret 2025/2026.

Hensikten med disse endringene er å redusere presset på Skjetten, Sagdalen og Stav, og få stabile langsiktige elevtall for hele skoleområdet Strømmen og Skjetten.

Den langsiktige løsningen for området anses å løses best ved en utvidelse av Skjetten med én klasserække til 4-parallell barneskole med ferdigstillelse til skoleåret 2026/2027.

### 6.7 Fetsund vest

Skoleområdet omfatter Garderåsen og Hovinhøgda. Fetsund vest (Garderåsen og Hovinhøgda).

Prognosen for perioden 2022 til 2031 viser vekst for Hovinhøgda på ca. 50 elever og tilsvarende negativ vekst i Gardeåsen skolekrets.

Skolene har tilstrekkelig samlet kapasitet til å håndtere elevtallet i planperioden, men lokalene trenger oppgradering. Planene for skolene bør evalueres på nytt. Evalueringen bør det utrede om begge skolene skal oppgraderes, eller om man skal samle elevene på én lokasjon. Videre bør lokaliseringen av den fremtidige svømmehall utredes. Eksisterende

prognoser tilsier at en samlet skoleløsning for Garderåsen og Hovinhøgda kan finnes innenfor rammen av tre paralleller. Det anbefales at en konseptvalgutredning utføres før det investeres i eksisterende bygningsmasse.

#### 6.7.1 Alternativ 0

Garderåsen opprettholdes som 1-7-skole, paviljong fjernes, og det gjennomføres en arealrevisjon og utbygging for en behovsdekkende kapasitet. Tiltaket ferdigstilles til skoleåret 2029/2030.

Hovinhøgda opprettholdes som 1-7-skole. Skolen rehabiliteres og bygges ut med en behovsdekkende kapasitet med ferdigstillelse til skoleåret 2027/2028.

Det bygges en ny svømmehall med ferdigstillelse i 2027.

Grunnkrets 1701<sup>4</sup>, Åkrene, overføres fra Hovinhøgda skolekrets til Vigernes skolekrets fra skoleåret 2023/2024.

#### 6.7.2 Alternativ 1

Det er kostnadsdrivende med to lokasjoner både mht. drift og investering. Ved en ny gjennomgang bør det ses på samlokalisering av de to skolene. En konseptvalgutredning vil klargjøre om det bør etableres en ny skole, eller om dagens to skoler skal videreføres. Konseptvalgutredning anbefales påbegynt i 2026.

Deler av grunnkrets 1701<sup>5</sup>, Åkrene, overføres fra Hovinhøgda skolekrets til Vigernes skolekrets fra skoleåret 2023/2024.

Som alternativ 1 foreslår vi et basseng som dekker behovet for svømmeopplæring på Fetsund vest. Svømmehall på Fetsund vest må inngå som en del av konseptvalgutredningen for skolene. Ferdigstillelse fastsettes når planleggingsarbeidet har kommet i gang.

### 6.8 Fetsund øst

Skoleområdet omfatter Riddersand og Østersund.

Østersund og Riddersand er nylig utbygd og vil ha tilstrekkelig kapasitet ut planperioden og sannsynligvis langt ut i neste planperiode. Østersund vil imidlertid være presset på kapasitet i slutten av perioden.

En forutsetning for tilstrekkelig kapasitet ved Østersund ungdomsskole er at sentrumsskolene Kjellervolla og Volla ferdigstilles som planlagt. Dette innebærer også at overflyttingen av Åkrene-elevene går som planlagt i 2025/2026. Det er tilstrekkelig plass på skoleområdet til å avbøte eventuell manglende kapasitet i slutten av planperioden, ved å sette opp paviljonger.

---

<sup>4</sup> Tienveien nordøst for krysning Rv22 tilhører Hovinhøgda

<sup>5</sup> Unntatt Tienveien etter krysning nord-øst for RV22

For Østersund ungdomsskolekrets viser ny og gammel prognose et nesten identisk forløp, hvor barnetallet for aldersgruppen 13-15 år mellom 2021 og 2030 anslås å øke med ca. 40 barn, gitt dagens skolegrenser (inkludert grunnkrets Åkrene).

Riddersand skolekrets vil få en jevn vekst i hele planperioden, men betydelig mer moderat enn tidligere anslått. Det legges ikke opp til alternative løsningsforslag for Fetsund øst i revidert skolebehovsplan. Alternativ 0 fra vedtaket fra april 2020 legges til grunn.

#### 6.8.1 Alternativ 0

Østersund ungdomsskole opprettholdes som i dag.

Riddersand skole er bygd ut som en 3-parallell barneskole i tråd med vedtatte planer.

#### 6.8.2 Alternativ 1

Som alternativ 0, men deler av grunnkrets 1801, Haga, overføres til Sørumsand skolekrets fra skoleåret 2023/2024.

### 6.9 Dalen

Skoleområdet omfatter Dalen skole. Skolen vil ha tilstrekkelig kapasitet ut planperioden. Skolen har ett ekstra klasserom og arealer som kan omgjøres hvis behovet likevel melder seg.

#### 6.9.1 Alternativ 0

Dalen skole opprettholdes med samme skolekrets som i dag.
